



**Lokālā shēma A**  
**ŠĶĒRSNOROBEŽOJUMS** - vēpusīgās vadstāvās maks  
 2m attālumā cits no citā, slīpumā līdz 1,3 pēc braukļu es  
 malu. Vismaz 3 vēpusīgās signalizācijas  
**GARENNOROBEŽOJUMS** - divpusīgās  
 vadstāvi maks 1,0m attālumā cits no citā.  
 Jālieto divpusīga signalizācija uz katra  
 otru vadstāvu.

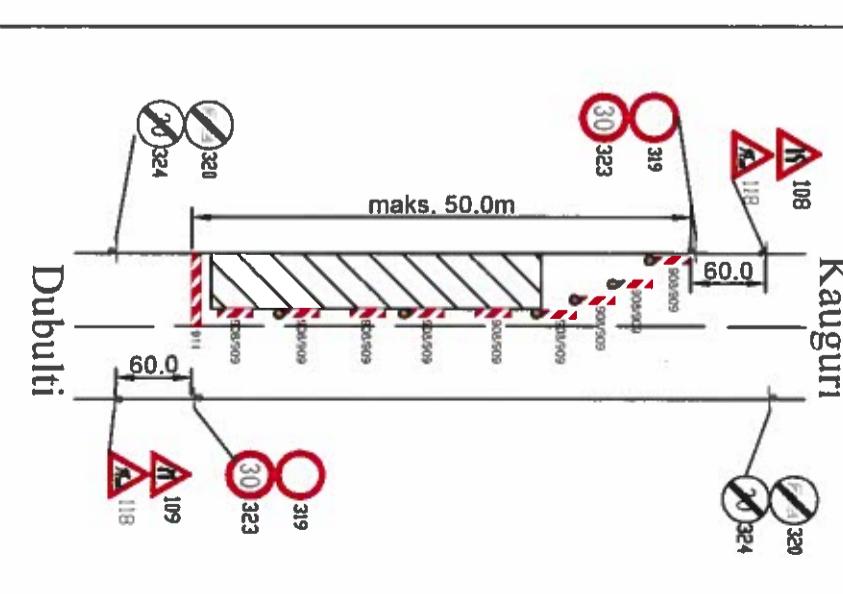

**Publiskais informāciju par darbu izpildes termiņiem, satiksmes ierobežojumiem uz būvdarbu laiku pievienojot saskarsmēs satiksmes organizācijas shēmas**  
**Būvdarbu zonas uz būvdarbu laiku esotie neatbilstošie ceļu satiksmes organizācijas iehniestie ūzdeķi atzīstam, vai pie demonstrācijas nododami SIA "Jūrmalas gaisma".**  
**Pēc būvdarbu pabeigšanas satiksmes organizācija objekta aizņemjama nepriekšējā stāvoklī par iecaisītā bānīteka ūzdeķiem.**  
**Uz būvdarbu laiku nodrošināt pliekšānu pie īpašumiem.**



1. Būvdarbu vietas aprikojums izmantojams visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām un brīvdienās.
2. Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu aprikošanu uz ceļiem"

**Piezīmes:**

1. Cela zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam LV77 "Cela zīmes" prasībām.
2. Nodrošināt piebraukšanas iespejas iedzīvotajiem, operatīvajam transportam un atkritumu izvedējiem.
3. Nodrošināt drošu gājēju kustību, būvderves norobežot ar signalizāciju un palīgajierām. Pārrokot gājēju ietves, nodrošināt gājēju tiltīnu ne mazāk kā 1,5m plauk.
4. Esošas cela zīmes nav paredzēts demontēt / aizķārt.
5. Shēmas uzstādīšanas un demontažas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
6. Cela zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Cela zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt 20-25 m pirms krustojuma.
7. Shēmas uzstādīšanas un demontažas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
8. Cela zīmes Nr. 118 uzstādīt 50-60m pirms būvdarbu zonas sākuma. Cela zīmes nr. 118+814/815/816 uzstādīt ierobežojumiem.

Jūrmalas pilsētas domes  
Atbilstības pārbaudes  
Būvniecības daļas būvītājiem  
Infrastruktūras inventāriju projektu nodalījums

Edgars Sarkans  
E.Sarkans

### 201 Esošās zīmes

**OBJEKTS** Sadzīves kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderešanas metodi  
**BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKS** 01.11.2021 - 08.11.2021

**BŪVUZŅĒMĒJS** SIA "TASSMA"  
 Reģ.Nr. 40103401578

**ATBILDIGĀS PAR SATIKSMES ORGANIZĀCIJU** Oskars Pavlovs tālr. 26779589  
**RĀSEJUMS** Satiksmes organizācijas shēma NR. 1

IZSTRĀDĀJA

SIA "Baltic Trailer Service", tālr. 27755501
